

PROYECTO: PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS

CONTRATO No. 1584

OBJETO: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA DE LOS BARRIOS ALTOS DEL CARRIZAL Y ALTOS DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE GIRON – DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

INFORME No.: 03


PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrolla en el Municipio de Girón, en los Barrios Altos del Carrizal y Altos del Mirador.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

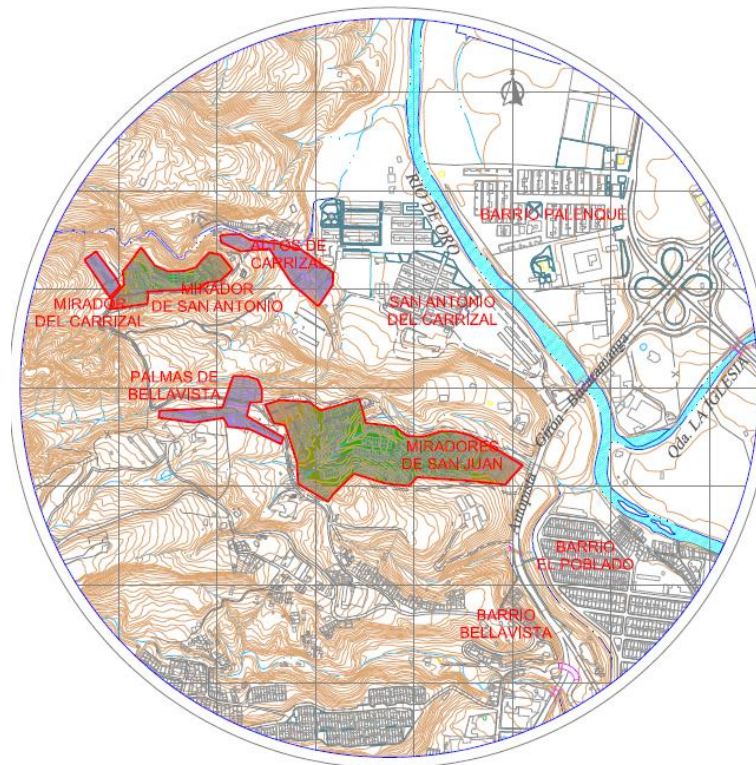



1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto “**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA DE LOS BARRIOS ALTOS DEL CARRIZAL Y ALTOS DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE GIRON – DEPARTAMENTO DE SANTANDER**”, ubicado en el Departamento de Santander, Municipio de Girón; el cual ejecutado por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A ESP –EMPAS beneficiando aproximadamente a 2400 habitantes, asentados en 3,40 hectáreas.

El proyecto busca principalmente la mitigación del impacto negativo que se está presentando actualmente por vertimiento directo de las aguas residuales domesticas a la Quebrada La Honda, por lo que es necesario la construcción de un sistema de redes de alcantarillado, para dar un correcto manejo a estas descargas, contribuyendo al saneamiento ambiental, progreso y desarrollo para la zona.

1.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO

Para el trimestre de Julio, Agosto y Septiembre del 2014 la obra se encuentra suspendida, por lo tanto, al no haber ejecución de actividades de obra, no se muestra evidencias en registro fotográfico de este periodo.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

DATO	DESCRIPCION
CONTRATO DE OBRA No.	0001584
Objeto	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA DE LOS BARRIOS ALTOS DEL CARRIZAL Y ALTOS DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE GIRON – DEPARTAMENTO DE SANTANDER..
MUNICIPIO:	GIRON
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. E.S.P
SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO
COORDINACION	EXPANSION DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR	CONSTRUMARCA LTDA
SUPERVISOR	ING. ENRIQUE TOLEDO CAMACHO
PROYECTO FINANCIADO POR EL FNR	FNR-33680
CONTRATISTA	SERGOM LTDA
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$2.191.455.598
VALOR ANTICIPO	\$654.191.080
PLAZO DE EJECUCION	180 DIAS
FECHA DE INICIO	13 Agosto de 2012
FECHA TERMINACION INICIAL	12 de Febrero 2013
FECHA DE SUSPENSION	15 Agosto de 2012
FECHA DE REINICIO	01 de Octubre de 2012
FECHA DE SUSPENSION	17 DE Diciembre de 2012.
FECHA DE REINICIO	15 de Febrero de 2013
FECHA DE SUSPENSION	06 de Mayo de 2013
FECHA AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN	05 DE Agosto de 2013
NUEVA FECHA DE ENTREGA	CONTRATO SUSPENDIDO

3. INFORME DE AVANCE:

Para el periodo Julio 01 a 30 de Septiembre de 2014, el porcentaje de avance de este periodo es 0% (por estar suspendida la obra), pero el porcentaje acumulado (lo ejecutado antes de la suspensión) es del 64.67%

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

ACTA No.	FECHA DEL ACTA	DESCRIPCION	VALOR DEL ACTA	% AVANCE
1	13/08/2012	Acta de Inicio		64,67%
2	30/07/2012	Acta de Entrega de anticipo	\$ 654.191.080	
3	18/10/2012	Acta de Suspensión.		
4	01/10/2012	Acta de Reinicio		
5	17/12/2012	Acta de Suspensión.		
6	15/02/2013	Acta de Reinicio		
7	28/02/2013	Acta de pago	\$ 1.417.253.550	
8	06/05/2014	Acta de Suspensión.		
9	05/07/2013	Acta Ampliación de la suspensión		

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DATO	DESCRIPCION
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	0001579
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA DE LOS BARRIOS ALTOS DEL CARRIZAL Y ALTOS DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE GIRON – DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
MUNICIPIO:	GIRON
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. E.S.P
SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO
COORDINACION	EXPANSION DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR	ING. ENRIQUE TOLEDO CAMACHO
PROYECTO FINANCIADO POR EL FNR	FNR-33680
CONTRATISTA	CONSTRUMARCA LTDA
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$ 131.487.160

VALOR ANTICIPO	\$ 34.005.300
PLAZO DE EJECUCION	7 MESES
FECHA DE INICIO	13 Agosto de 2012
FECHA TERMINACION INICIAL	12 de Marzo de 2013
FECHA DE SUSPENSION	15 Agosto de 2012
FECHA DE REINICIO	01 de Octubre de 2012
FECHA DE SUSPENSION	17 DE Diciembre de 2012.
FECHA DE REINICIO	15 de Febrero de 2013
FECHA DE SUSPENSION	06 de Mayo de 2013
FECHA AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN	05 DE Agosto de 2013
NUEVA FECHA DE ENTREGA	CONTRATO SUSPENDIDO
