

PROYECTO: PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS

CONTRATO No. 3634


OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES EL CONSUELO Y PUEBLITO VIEJO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

INFORME No. 8

PERIODO: 25 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO Y ENTRE 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2020

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1. LOCALIZACION

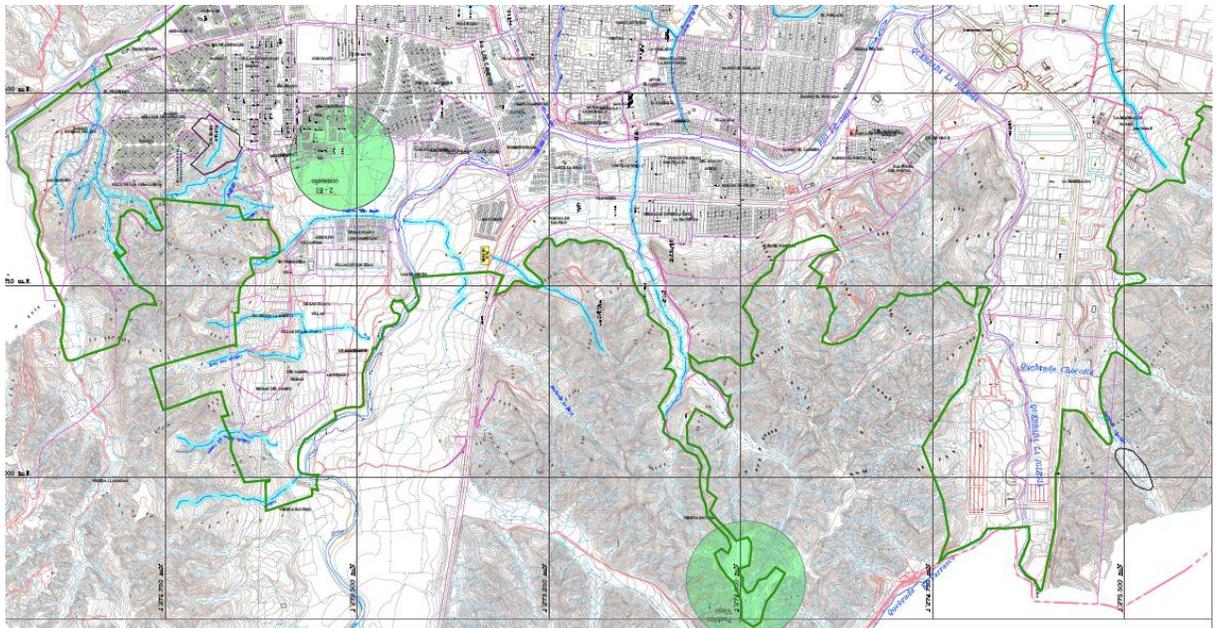

Mediante el contrato 003634 se ejecutaron obras en los siguientes sectores del municipio de Girón:

- Construcción reposición sistema alcantarillado Sanitario y Pluvial Barrio El Consuelo: calle 14 entre calles 19a y 22.
- Construcción Sistema Alcantarillado Barrio Pueblito Viejo.

2. ACTIVIDADES TECNICAS DE EJECUCION

CONTRATO DE OBRA N° 3634		
BARRIO		PUEBLITO VIEJO
ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Preliminares	<p>Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L5-P(PV)L4, replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, instalación de tubería de 355mm y relleno común compactado.</p> <p>Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L12-P(PV)L3</p> <p>Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)L6</p> <p>Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L14-P(PV)L3</p> <p>Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)L12</p> <p>Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L11-P(PV)L2</p> <p>Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)L11</p> <p>Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L30-P(PV)L18,</p> <p>Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)L14</p> <p>Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)L4</p> <p>Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L4-P(PV)L3,</p> <p>Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L30-P(PV)L18,</p> <p>Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)R56A-P(PV)R56B</p> <p>Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)R5</p> <p>Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L30-P(PV)L18</p> <p>Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L3-P(PV)L2</p> <p>Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)R56A</p> <p>Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)R56B</p> <p>Excavación manual para construcción del pozo de inspección P(PV)L3</p>

CONTRATO DE OBRA N° 3634		
BARRIO		PUEBLITO VIEJO
ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
		Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)R4-P(PV)L31, para conexión red sanitaria de 200mm. Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)R70-P(PV)R69, Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)R4-P(PV)R31
2	Señalización	N/A
3	Campamento	N/A
4	Movimientos De Tierra	N/A
5	Tuberías Prefabricadas	<ul style="list-style-type: none"> - Instalación de tubería P(PV)L5-P(PV)L4 de 355mm - tramo P(PV)L12-P(PV)L3 de 300 mm - Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado P(PV)L12-P(PV)L3. - Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado - P(PV)L14-P(PV)L3 - Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado en el tramo P(PV)L14-P(PV)L3 - Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado en el tramo P(PV)L11-P(PV)L2 - Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado en el tramo P(PV)L30-P(PV)L18, - Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado en el tramo P(PV)L30-P(PV)L18 - Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado en el tramo P(PV)L4-P(PV)L3. - Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación. En el tramo P(PV)R56A-P(PV)R56B, instalación de tubería de 200mm y relleno común compactado. - Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L30-P(PV)L18, replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación,

CONTRATO DE OBRA N° 3634		
BARRIO		PUEBLITO VIEJO
ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
		<p>instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado en el tramo P(PV)L3-P(PV)L2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, instalación de tubería de 300mm y relleno común compactado, en el tramo P(PV)L3-P(PV)L2 - Replanteo de fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, instalación de tubería de 200mm y relleno común compactado en el tramo P(PV)R4-P(PV)L31,
6	Estructuras	<ul style="list-style-type: none"> - Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección P(PV)L1 - Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección P(PV)L16, solado - Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección P(PV)L15, reducción en mampostería - Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección P(PV)L5 - Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección P(PV)L12 - Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección P(PV)L6 - Fundida de cilindro en concreto de 3000psi y reducción en ladrillo en el pozo de inspección P(PV)L11 - Fundida de solado en concreto, corona en el pozo de inspección P(PV)L4 - Construcción de cilindro y reducción en mampostería en el pozo de inspección P(PV)L11 - Fundida de piso Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección P(PV)R56B - Fundida en concreto en el pozo de inspección P(PV)R5 - Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección P(PV)L3 - Replanteo fondo de zanja, instalación de arena para cimentación, instalación en el tramo P(PV)R70-P(PV)R69de tubería de 200mm y relleno común compactado. - Construcción de cilindro en mampostería en el pozo de inspección P(PV)L2 - Construcción de cilindro en mampostería en el pozo de inspección P(PV)L3 - Construcción de cilindro en mampostería en el pozo de inspección P(PV)R56A

CONTRATO DE OBRA N° 3634		
BARRIO		PUEBLITO VIEJO
ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES EJECUTADAS
		<ul style="list-style-type: none"> - Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección P(PV)R5 - Construcción de cilindro en mampostería en el pozo de inspección P(PV)R56B - Instalación de corona en concreto en el pozo de inspección P(PV)L4
7	Varios	N/A

3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION

Se presenta suspensión el 20 de Marzo de 2020 por requerimiento de la presidencia de la república, de realizar cuarentena, por emergencia sanitaria por COVID-19

4. RELACION DE ACTAS

Acta N°1: Acta de verificación de personal.

Acta N°2: Acta de inicio del contrato de obra.

Acta N°3: Acta de entrega de anticipo.

Acta N°4: Acta de recibo y pago parcial N°1

Acta N°5: Acta de recibo y pago parcial N°2

Acta N°6: Mayores y menores cantidades de obra N°2.

Acta N°7: Adición al valor fiscal.

Acta N°8: Acta de entrega de anticipo.

Acta N°9: Acta de recibo y pago parcial N°3

Acta N°10: Acta de recibo y pago parcial N°4

Acta N°11: Suspensión

Acta N°12: Reinicio

5. ANALISIS FINANCIERO

ANÁLISIS FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 3634		
	Valor contratado con adicional	Facturado actas
VALOR CONTRATADO	\$ 6.096.987.726	
VALOR EJECUTADO EN ACTA 1		\$ 414.260.485
VALOR EJECUTADO EN ACTA 2		\$ 1.149.542.578
VALOR EJECUTADO EN ACTA 3		\$ 1.172.361.722
VALOR POR EJECUTAR		\$3.360.822.941

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

PUEBLITO VIEJO	
	
Instalación de tubería de 300mm en el tramo P(PV)L12 P(PV)L3	Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección P(PV)L1



Instalación de tubería de 355mm en el tramo P(PV)L5 P(PV)L4



Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección P(PV)L16



Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L12-P(PV)L3



Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección P(PV)L5



Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L4-P(PV)L3



Excavación con retroexcavadora en el tramo P(PV)L14-P(PV)L3



Fundida de cilindro en concreto de 3000psi en el pozo de inspección P(PV)L6



Excavación manual para construcción pozo de inspección P(PV)L11



Instalación de tubería de 300mm en el tramo P(PV)L4-P(PV)L3



Replanteo instalación de arena para cimentación en el tramo P(PV)L11-P(PV)L2



Instalación de corona en concreto en el pozo de inspección P(PV)L4



Construcción de cilindro en mampostería en el pozo de inspección P(PV)L2

EL CONSUELO



Excavación en el tramo



Excavación en el tramo



Compactación



Excavación con retroexcavadora en el tramo



Fundida de bordillo.



Desmonte de campamento.



7. CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	003623 DE 2019	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de Junio de 2019	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA	
VALOR INICIAL:	\$1.279.321.400	
PLAZO INICIAL:	09 meses	
PLAZO ADICIONAL	03 meses	
ANTICIPO:	15%	\$1.279.321.400
FECHA DE INICIO:	25 de Julio de 2019	
CONTRATISTA:	CISGO SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	Jenny Patricia Gómez Guisa	
NIT:	901.230.3475	
SUPERVISOR:	Asesor Expansión de Infraestructura	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2020	
FECHA DE SUSPENSION	20 de Marzo de 2020	
FECHA REINICIO	28 de Julio de 2020	
TOTAL:		\$1.557.019.800
CONTRATOS RELACIONADOS:	Contrato de Obra No. 003633 de 2019	
CONTRATOS RELACIONADOS:	Contrato de Obra No. 003634 de 2019	
